

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1019	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/14/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/18
<b>Last Update</b>	03/14/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/17/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	San Francisco-Mocoa Alternate Road Construction Project - Phase I	<b>Loan Number</b>	2271/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	Instituto Nacional de Vias	<b>Sector/Subsector</b>	TR-VPR - TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
<b>Team Leader</b>	PINTO AYALA, ANA MARIA	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COLOMBIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	A	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Partially Unsatisfactory		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1019	53,000,000	43,920,267.2	150,000,000	0	203,000,000	43,920,267.2	43,920,267.2	100.00%	0
Aggregated	53,000,000	43,920,267.2	150,000,000	0	203,000,000	43,920,267.2	43,920,267.2	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

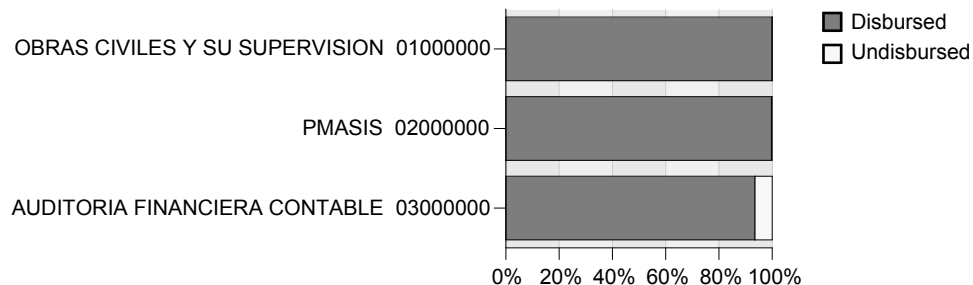

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Condiciones de eficiencia, conservación ambiental y seguridad del corredor vial Pasto - Mocoa mejoradas, mediante la construcción de la Variante San Francisco - Mocoa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Número de días al año con restricciones severas de circulación de la vía entre San Francisco y Mocoa, al tránsito seguro y continuo de pasajeros y carga	Días	183.00	2009	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reportes de registros del estado y disponibilidad de la variante por parte del INVIAS, regionales Nariño y Putumayo.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Reducción del tiempo promedio de viaje entre San Francisco y Mocoa.	Horas	2.50	2009	P		1.50
					P(a)		1.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** El INVIAS realizará reportes de conteos y registros de tiempos de viaje durante el primer año de operación de la variante

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.3	Reducción del costo promedio por Km de operación vehicular entre San Francisco y Mocoa	US\$/Km	105.00	2009	P		61.00
					P(a)		61.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe final de Evaluación de Costos del INVIAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.4	Aumento de las áreas protegidas de la zona de influencia de la variante.	Ha	34,600.00	2009	P		65,289.00
					P(a)		65,289.00
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** i) Resolución declaratoria de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa - RFPCARM, ii) Acuerdo del Consejo Directivo de Corpoamazonía declarando el Distrito de Manejo Integral - DMI de Mocoa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.5	Reducción del número promedio de accidentes que se presentan al año actualmente entre San Francisco-Mocoa	No. accidentes/año	23.00	2009	P		12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Reportes del registro mensual del número y severidad de accidentes, por parte de las oficinas del INVIAS en Mocoa (Putumayo)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Obras civiles y su supervisión**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Frente de San Francisco construido	Roads (km)	P	6.9	21.9	14,351,294	79,730,233
			P(a)	0	7.12	0	87,721,849.98
			A	0	7.12	10,652,506	87,721,849.98
1.2	Frente Mocoa construido	Roads (km)	P	5.7	23.7	10,472,566	77,796,487
			P(a)	0	9.04	284,835.14	81,302,883.29
			A	0	9.04	8,369,826	81,302,883.29
1.3	Supervisión (Interventoría) de obras contratada y operando	Supervisión	P	0	2	1,528,250	11,142,636.22
			P(a)	0	6	135,687	11,006,949.28
			A	0	6	0	11,006,949.28

**Component Nbr. 2 Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado Sostenible - PMASIS**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Ordenamiento territorial consolidado	Plan	P	0	1	297,575	1,048,738
			P(a)	0	0	0	387,855.82
			A	0	0	0	387,855.82
2.2	Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Plan	P	0	1	502,240	4,129,406.42
			P(a)		0	64,884.28	2,555,293.41
			A	0	0	138,771.81	2,555,293.41
2.3	Comunidad vinculada a la Protección de las Áreas Protegidas	Comunidad vinculada	P	0	1	196,862	1,288,678
			P(a)	0	0	0	381,598.91
			A	0	0	0	381,598.91
2.4	Plan de Operación Control y Vigilancia de las áreas protegidas implementado	Plan	P	0	1	1,540,618	2,713,305
			P(a)	0	0	0	190,829.73
			A	0	0	18,098.3	190,829.73

**Other Cost**

Gerencia del Proyecto Auditoria financiera y Contable	P			312,500	2,519,599.79
	P(a)			35,463.44	2,290,270.22
	A			336,492.69	2,290,270.22

**Total Cost**

Total Cost	P			29,201,905	180,369,083.43
	P(a)			520,869.86	185,837,530.64
	A			19,515,694.8	185,837,530.64

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas de Protegidas, implementado	Modify Output	Se modificaron las metas de plan de conservación debido a la cancelación anticipada del proyecto solicitada por el GdP	03/08/2018	09/14/2018
